Enero
2022

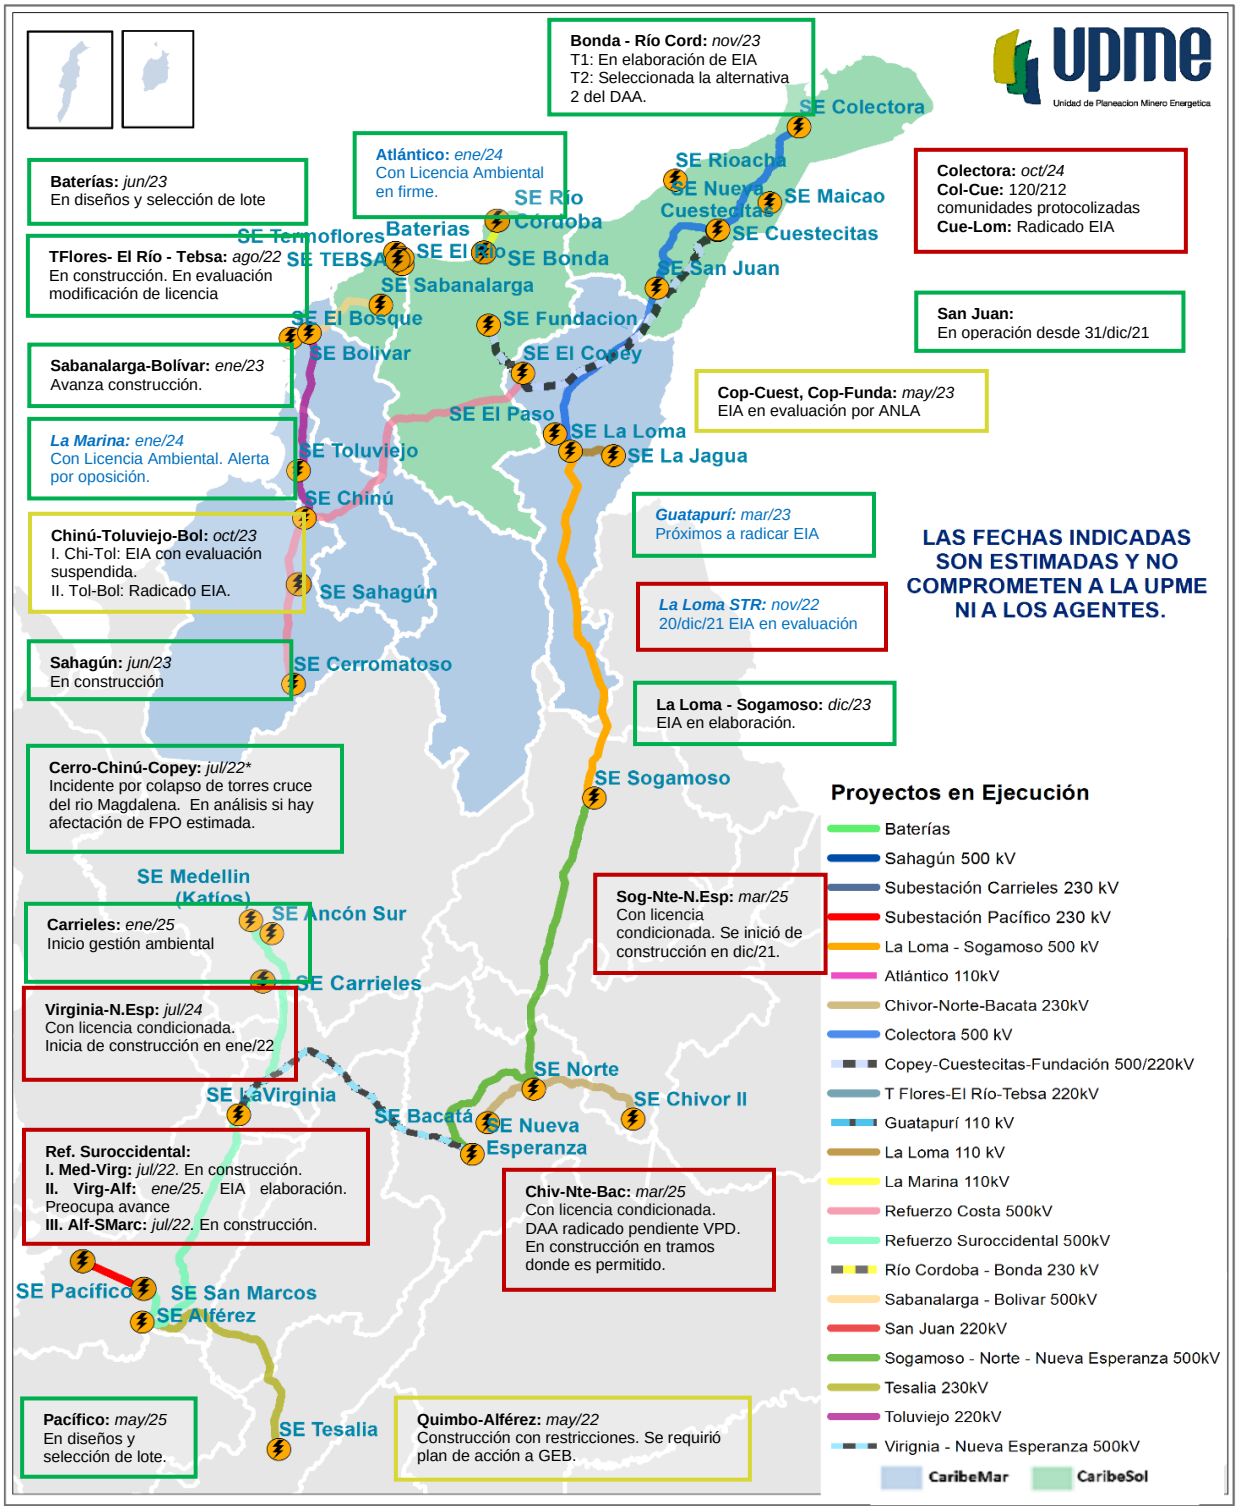

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Febrero
2022

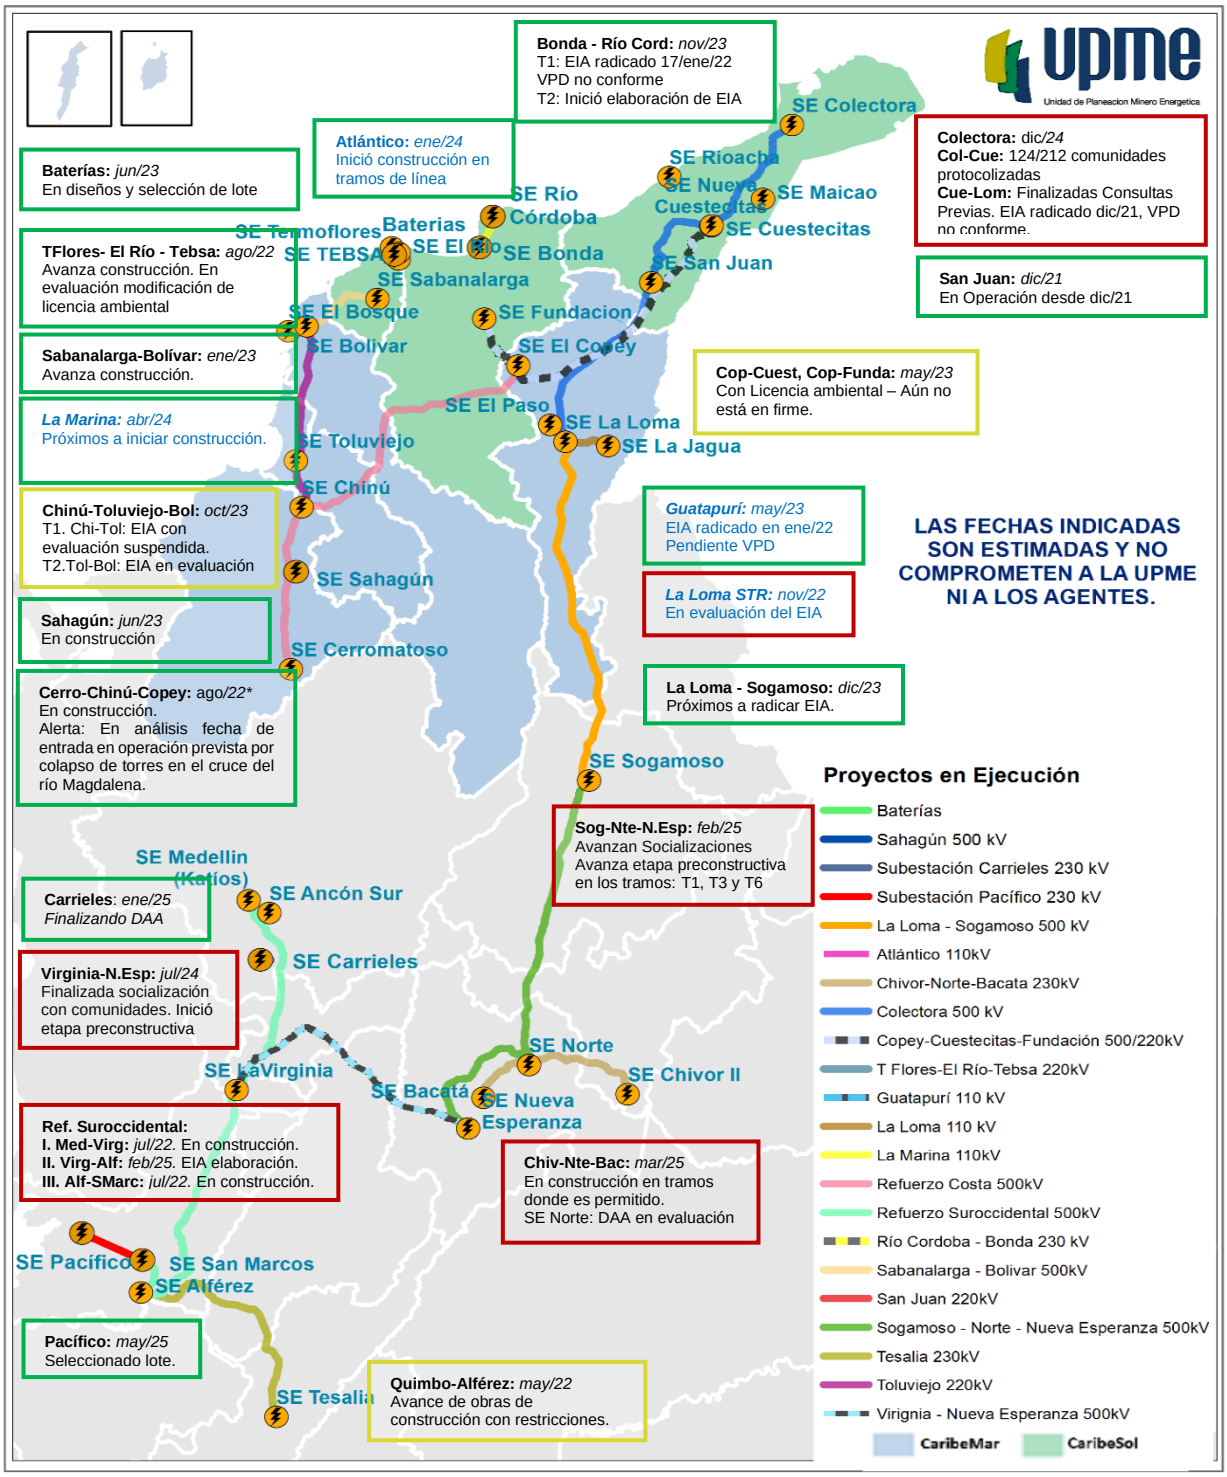

Marzo
2022

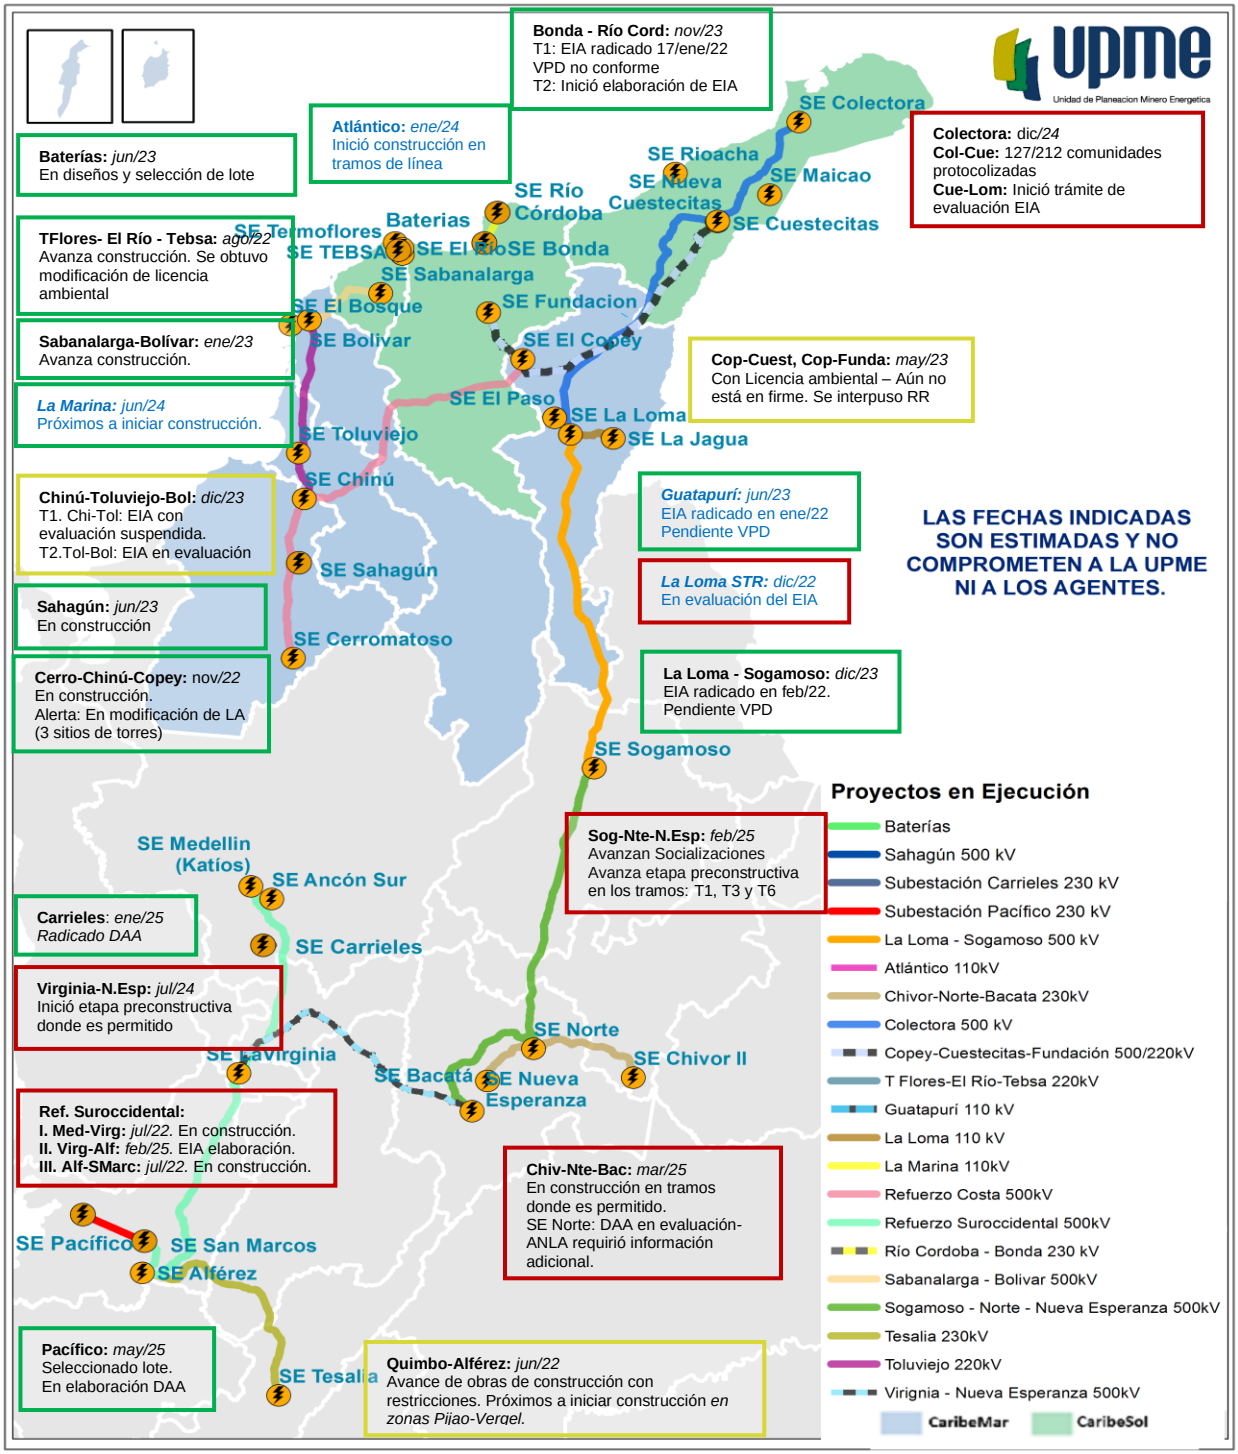

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Abril 2022

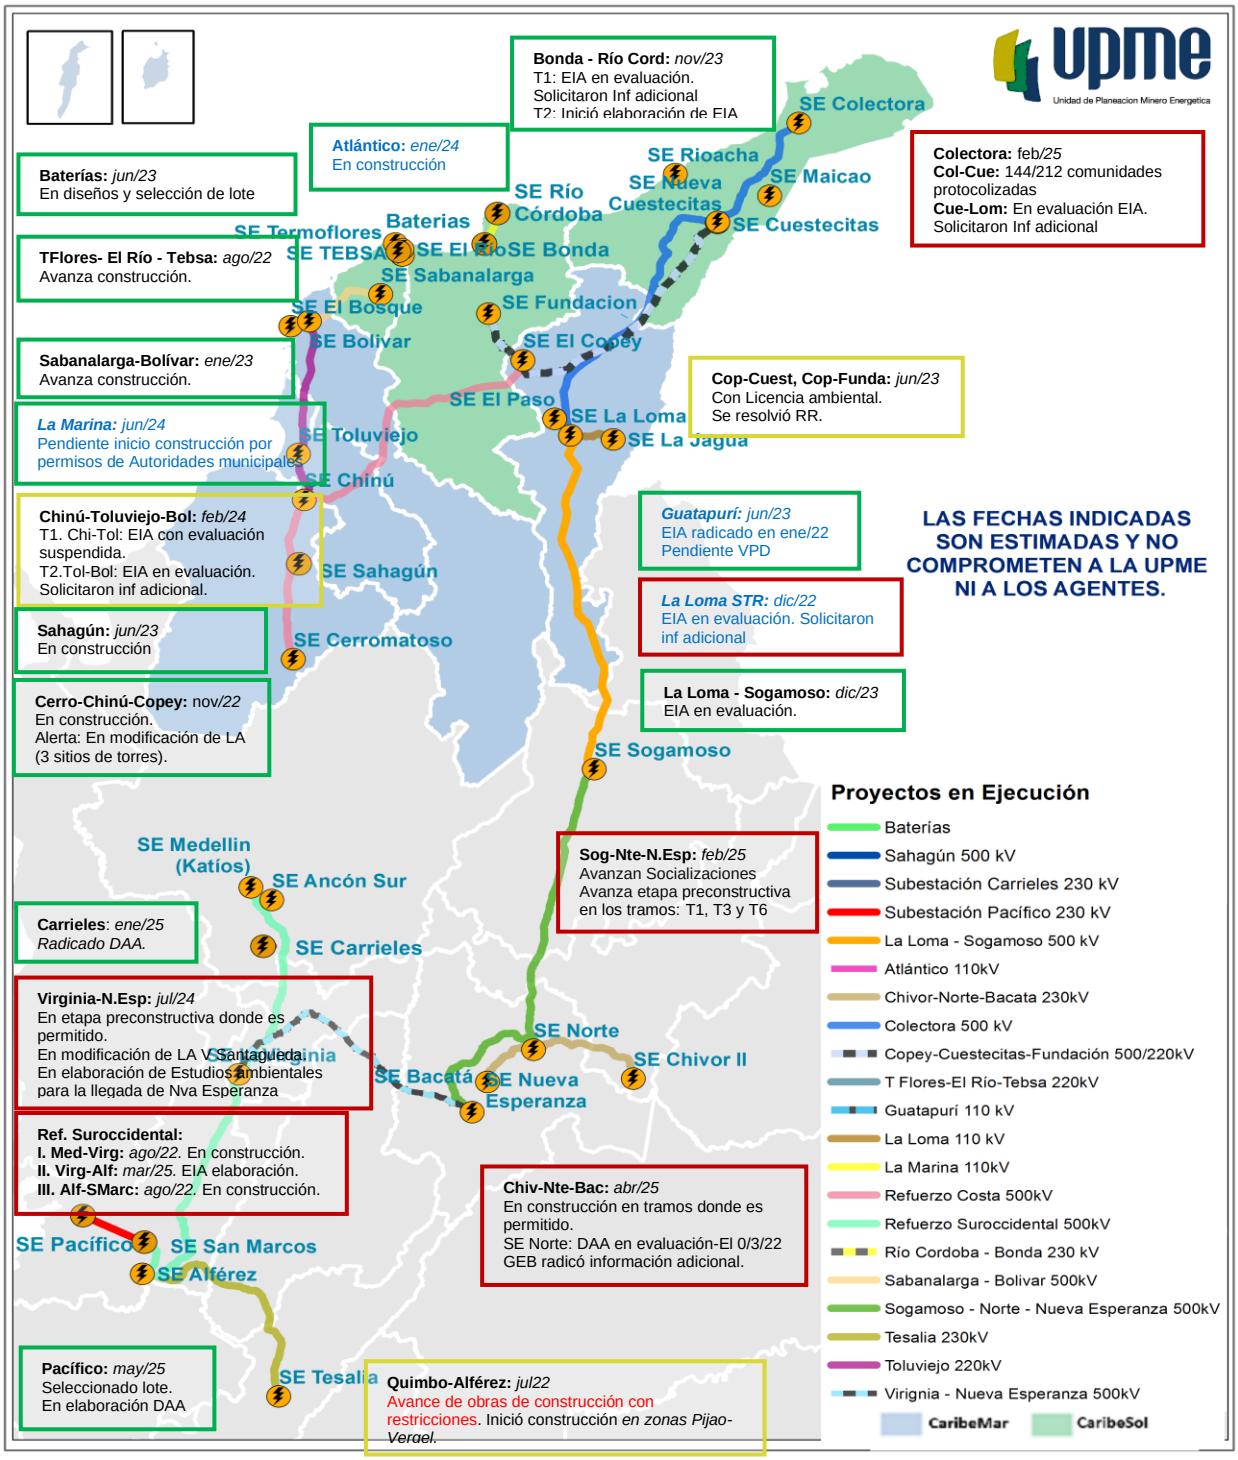
Bonda - Río Cord: nov/23
T1: EIA en evaluación.
Solicitaron Inf adicional
T2: Inició elaboración de EIA
Atlántico: ene/24
En construcción
Baterías: jun/23
En diseños y selección de lote
TFlores- El Río - Tebsa: ago/22
Avanza construcción.
Sabanalarga-Bolívar: ene/23
Avanza construcción.
La Marina: jun/24
Pendiente inicio construcción por permisos de Autoridades municipales
Chinú-Toluviejo-Bol: feb/24
T1. Chi-Tol: EIA con evaluación suspendida.
T2.Tol-Bol: EIA en evaluación.
Solicitaron inf adicional.
Sahagún: jun/23
En construcción
Cerro-Chinú-Copey: nov/22
En construcción.
Alerta: En modificación de LA
(3 sitios de torres).
Colectora: feb/25
Col-Cue: 144/212 comunidades protocolizadas
Cue-Lom: En evaluación EIA.
Solicitaron Inf adicional
Cop-Cuest, Cop-Funda: jun/23
Con Licencia ambiental.
Se resolvió RR.
Guatapurí: jun/23
EIA radicado en ene/22
Pendiente VPD
La Loma STR: dic/22
EIA en evaluación. Solicitaron inf adicional
La Loma - Sogamoso: dic/23
EIA en evaluación.
Sog-Nte-N.Esp: feb/25
Avanzan Socializaciones
Avanza etapa preconstructiva en los tramos: T1, T3 y T6
Carrieles: ene/25
Radicado DAA.
Virginia-N.Esp: jul/24
En etapa preconstructiva donde es permitido.
En modificación de LA V
En elaboración de Estudios Ambientales para la llegada de Nva Esperanza
Ref. Suroccidental:
I. Med-Virg: ago/22. En construcción.
II. Virg-Alf: mar/25. EIA elaboración.
III. Alf-SMarc: ago/22. En construcción.
Chiv-Nte-Bac: abr/25
En construcción en tramos donde es permitido.
SE Norte: DAA en evaluación-El 0/3/22
GEB radicó información adicional.
Pacífico: may/25
Seleccionado lote.
En elaboración DAA
Quimbo-Alférez: jul22
Avance de obras de construcción con restricciones. Inició construcción en zonas Pijao-Verael.
LAS FECHAS INDICADAS SON ESTIMADAS Y NO COMPROMETEN A LA UPME NI A LOS AGENTES.
Proyectos en Ejecución
Baterías
Sahagún 500 kV
Subestación Carrieles 230 kV
Subestación Pacífico 230 kV
La Loma - Sogamoso 500 kV
Atlántico 110kV
Chivor-Norte-Bacata 230kV
Colectora 500 kV
Copey-Cuestecitas-Fundación 500/220kV
T Flores-El Río-Tebsa 220kV
Guatapurí 110 kV
La Loma 110 kV
La Marina 110kV
Refuerzo Costa 500kV
Refuerzo Suroccidental 500kV
Río Cordoba - Bonda 230 kV
Sabanalarga - Bolivar 500kV
Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500kV
Tesalia 230kV
Toluviejo 220kV
Virignia - Nueva Esperanza 500kV
CaribeMar
CaribeSol
SE Colectora
SE Rioacha
SE Nueva Cuestecitas
SE Maicao
SE Cuestecitas
SE Río Córdoba
Baterias
SE Termoflores
SE TEBSA
SE El Río
SE Bonda
SE Sabanalarga
SE El Bosque
SE Fundacion
SE Bolivar
SE El Copey
SE El Paso
SE La Loma
SE La Jagua
SE Toluviejo
SE Chinú
SE Sahagún
SE Cerromatoso
SE Sogamoso
SE Medellin (Katíos)
SE Ancón Sur
SE Carrieles
SE Norte
SE Chivor II
SE Bacatá
SE Nueva Esperanza
SE Pacífico
SE San Marcos
SE Alférez
SE Tesalia

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Mayo 2022

upme

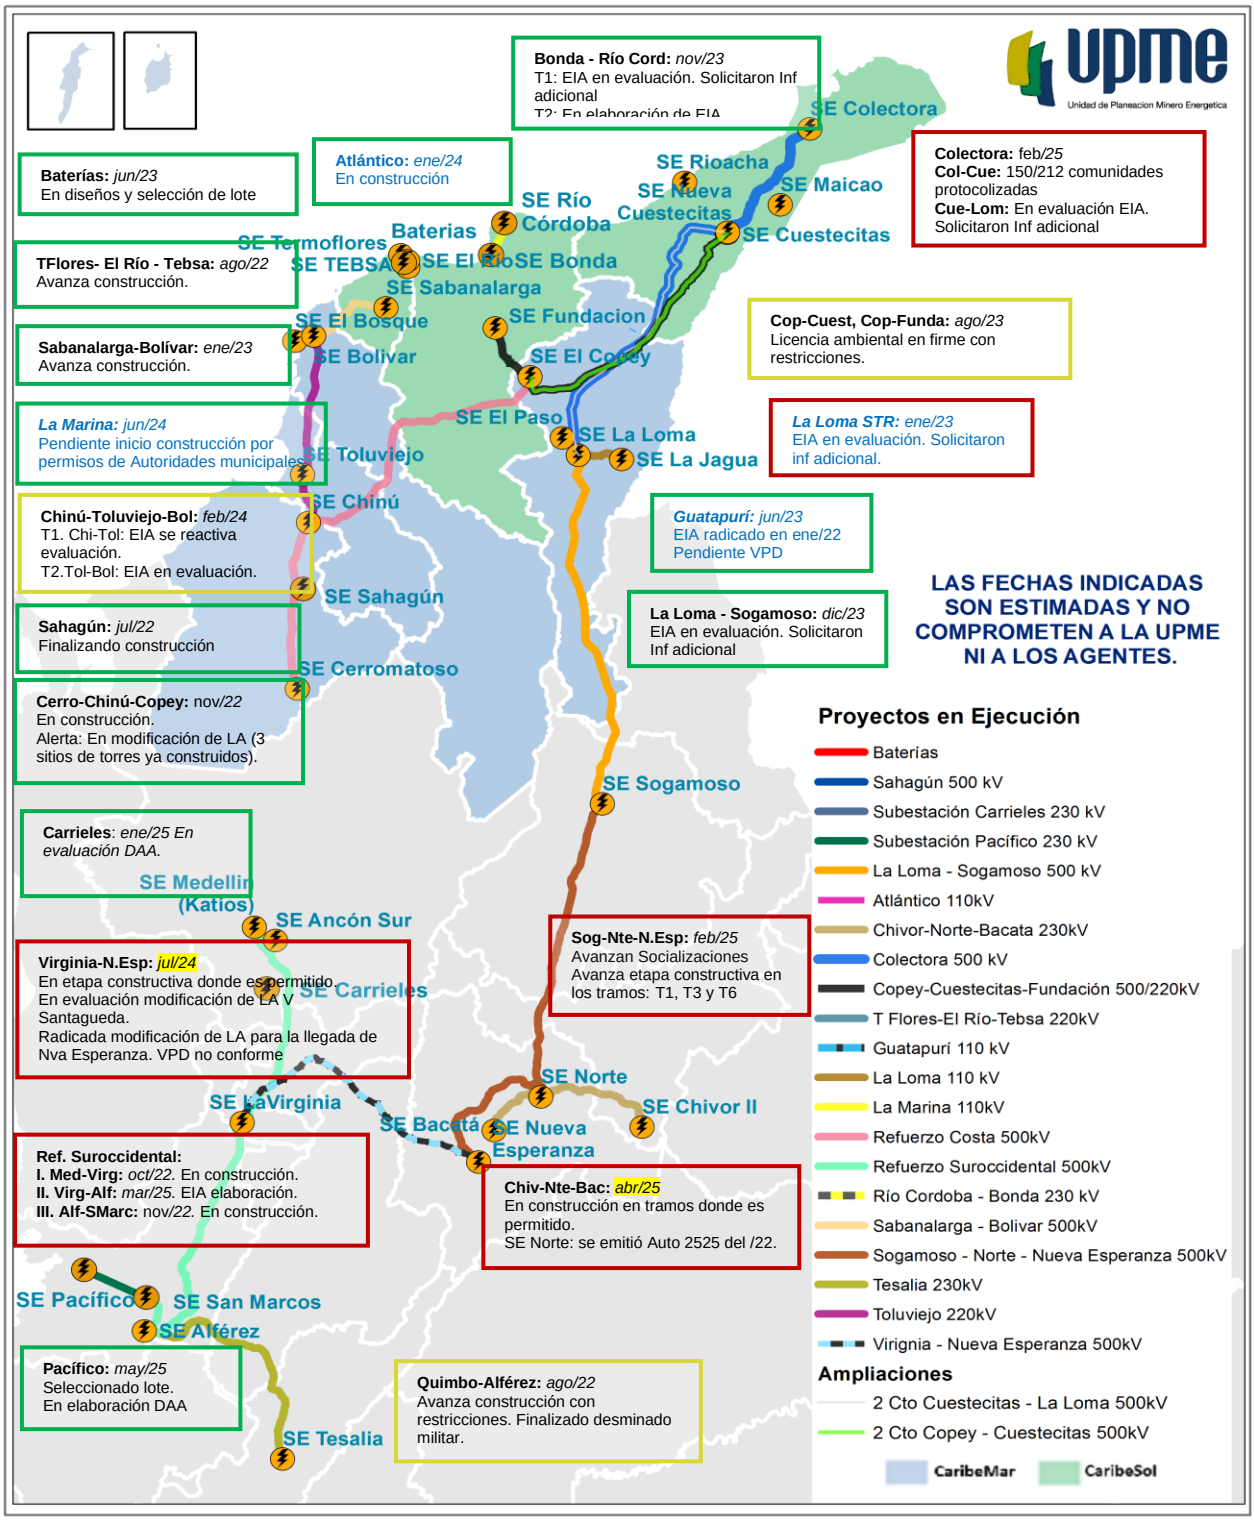

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

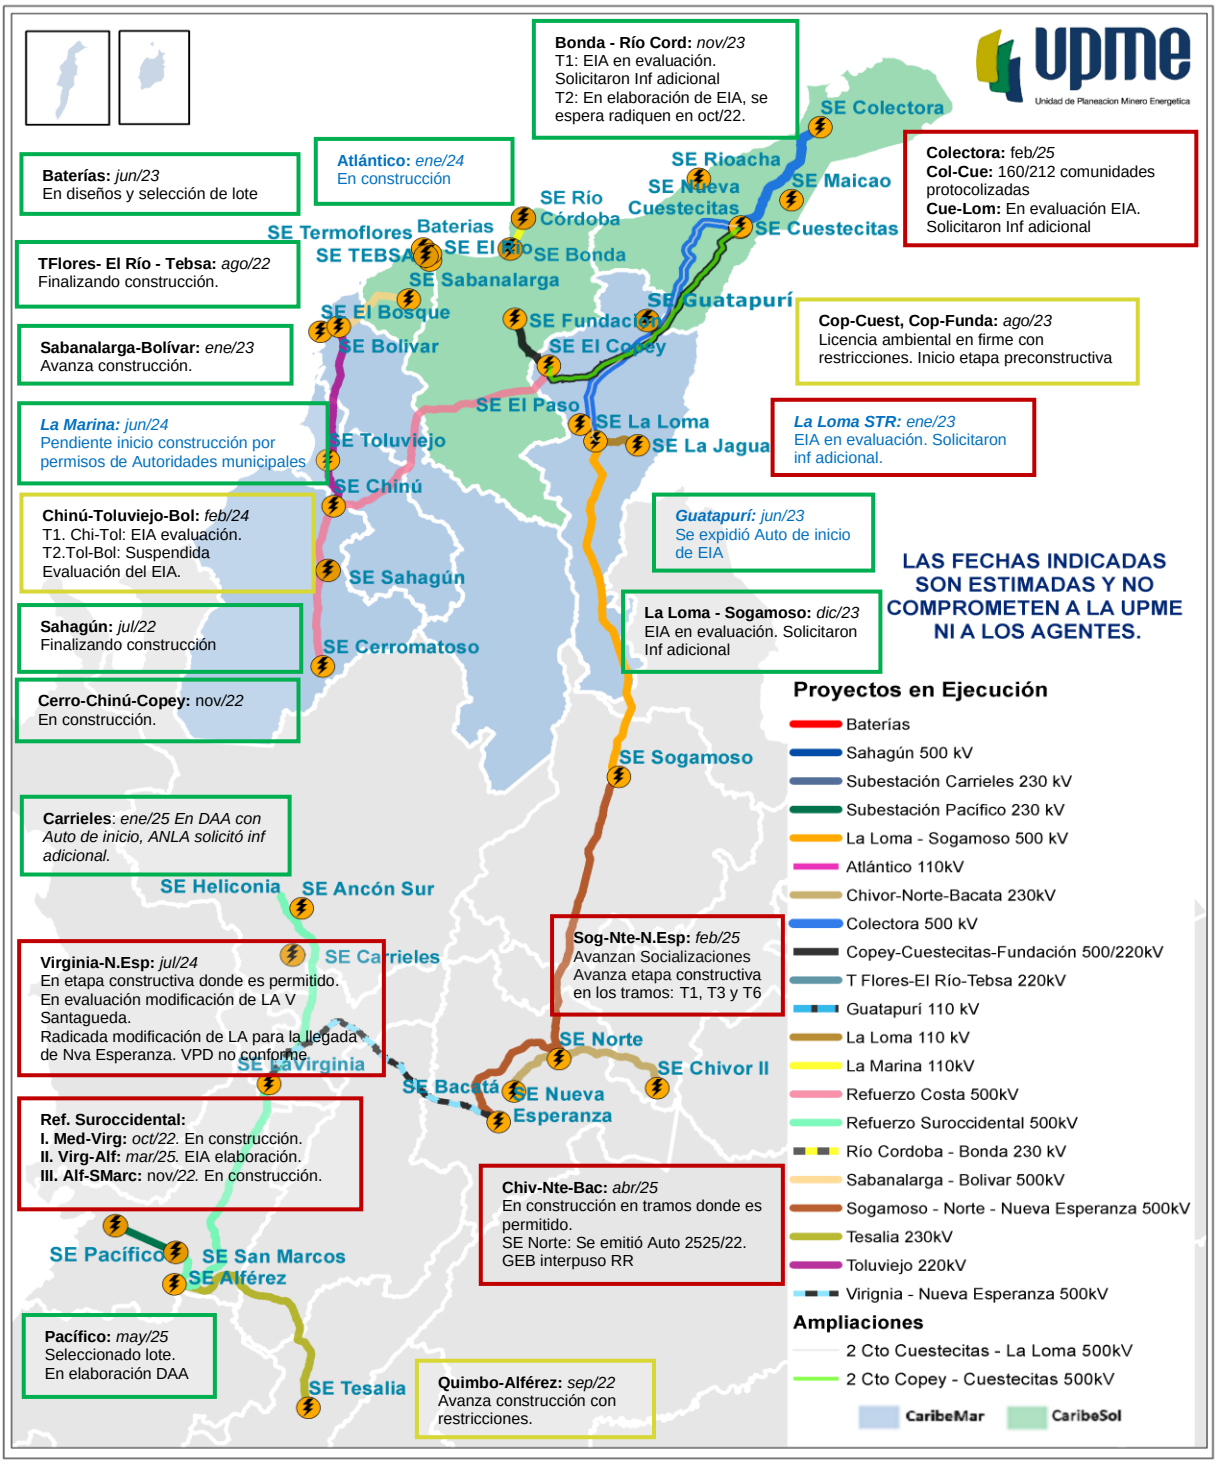
upme
Unidad de Planeacion Minero Energetica
Bonda - Río Cord: nov/23
T1: EIA en evaluación. Solicitaron Inf adicional
T2: En elaboración de EIA, se espera radiquen en oct/22.
Baterías: jun/23
En diseños y selección de lote
Atlántico: ene/24
En construcción
Colectora: feb/25
Col-Cue: 160/212 comunidades protocolizadas
Cue-Lom: En evaluación EIA. Solicitaron Inf adicional
TFlores- El Río - Tebsa: ago/22
Finalizando construcción.
Sabanalarga-Bolívar: ene/23
Avanza construcción.
Cop-Cuest, Cop-Funda: ago/23
Licencia ambiental en firme con restricciones. Inicio etapa preconstructiva
La Marina: jun/24
Pendiente inicio construcción por permisos de Autoridades municipales
La Loma STR: ene/23
EIA en evaluación. Solicitaron inf adicional.
Chinú-Toluviejo-Bol: feb/24
T1. Chi-Tol: EIA evaluación.
T2.Tol-Bol: Suspendida Evaluación del EIA.
Guatapurí: jun/23
Se expidió Auto de inicio de EIA
LAS FECHAS INDICADAS SON ESTIMADAS Y NO COMPROMETEN A LA UPME NI A LOS AGENTES.
Sahagún: jul/22
Finalizando construcción
La Loma - Sogamoso: dic/23
EIA en evaluación. Solicitaron Inf adicional
Cerro-Chinú-Copey: nov/22
En construcción.
Carrieles: ene/25 En DAA con Auto de inicio, ANLA solicitó inf adicional.
Sog-Nte-N.Esp: feb/25
Avanzan Socializaciones
Avanza etapa constructiva en los tramos: T1, T3 y T6
Virginia-N.Esp: jul/24
En etapa constructiva donde es permitido.
En evaluación modificación de LA V Santagueda.
Radicada modificación de LA para la llegada de Nva Esperanza. VPD no conforme
Ref. Suroccidental:
I. Med-Virg: oct/22. En construcción.
II. Virg-Alf: mar/25. EIA elaboración.
III. Alf-SMarc: nov/22. En construcción.
Chiv-Nte-Bac: abr/25
En construcción en tramos donde es permitido.
SE Norte: Se emitió Auto 2525/22.
GEB interpuso RR
Pacífico: may/25
Seleccionado lote.
En elaboración DAA
Quimbo-Alférez: sep/22
Avanza construcción con restricciones.
SE Colectora
SE Rioacha
SE Nueva Cuestecitas
SE Maicao
SE Cuestecitas
SE Río Córdoba
SE Termoflores
Baterias
SE TEBSA
SE El Río
SE Bonda
SE Sabanalarga
SE Guatapurí
SE El Bosque
SE Fundación
SE Bolívar
SE El Copey
SE El Paso
SE La Loma
SE La Jagua
SE Toluviejo
SE Chinú
SE Sahagún
SE Cerromatoso
SE Sogamoso
SE Heliconia
SE Ancón Sur
SE Carrieles
SE La Virginia
SE Bacatá
SE Nueva Esperanza
SE Norte
SE Chivor II
SE Pacífico
SE San Marcos
SE Alférez
SE Tesalia
Proyectos en Ejecución
Baterías
Sahagún 500 kV
Subestación Carrieles 230 kV
Subestación Pacífico 230 kV
La Loma - Sogamoso 500 kV
Atlántico 110kV
Chivor-Norte-Bacata 230kV
Colectora 500 kV
Copey-Cuestecitas-Fundación 500/220kV
T Flores-El Río-Tebsa 220kV
Guatapurí 110 kV
La Loma 110 kV
La Marina 110kV
Refuerzo Costa 500kV
Refuerzo Suroccidental 500kV
Río Cordoba - Bonda 230 kV
Sabanalarga - Bolivar 500kV
Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500kV
Tesalia 230kV
Toluviejo 220kV
Virignia - Nueva Esperanza 500kV
Ampliaciones
2 Cto Cuestecitas - La Loma 500kV
2 Cto Copey - Cuestecitas 500kV
CaribeMar
CaribeSol

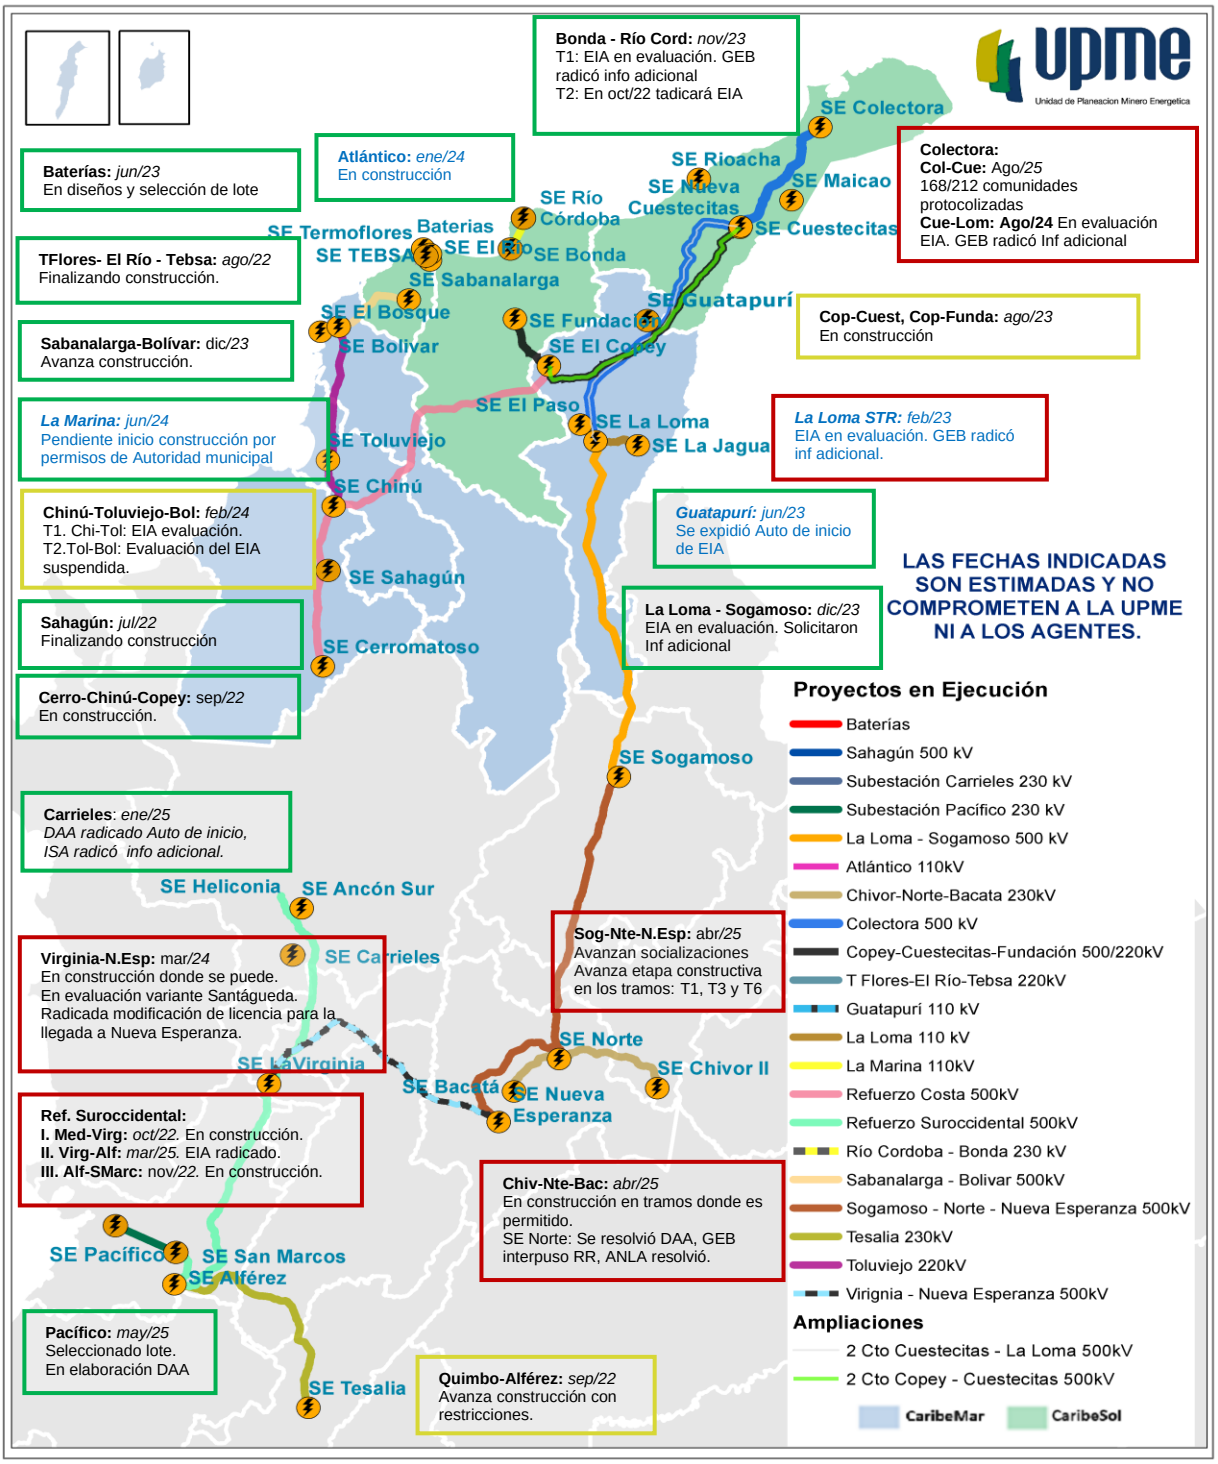
upme
Unidad de Planeacion Minero Energetica
Bonda - Río Cord: nov/23
T1: EIA en evaluación. GEB radicó info adicional
T2: En oct/22 tadicará EIA
Baterías: jun/23
En diseños y selección de lote
Atlántico: ene/24
En construcción
Colectora:
Col-Cue: Ago/25
168/212 comunidades protocolizadas
Cue-Lom: Ago/24 En evaluación EIA. GEB radicó Inf adicional
TFlores- El Río - Tebsa: ago/22
Finalizando construcción.
Sabanalarga-Bolívar: dic/23
Avanza construcción.
Cop-Cuest, Cop-Funda: ago/23
En construcción
La Marina: jun/24
Pendiente inicio construcción por permisos de Autoridad municipal
La Loma STR: feb/23
EIA en evaluación. GEB radicó inf adicional.
Chinú-Toluviejo-Bol: feb/24
T1. Chi-Tol: EIA evaluación.
T2.Tol-Bol: Evaluación del EIA suspendida.
Guatapurí: jun/23
Se expidió Auto de inicio de EIA
LAS FECHAS INDICADAS SON ESTIMADAS Y NO COMPROMETEN A LA UPME NI A LOS AGENTES.
Sahagún: jul/22
Finalizando construcción
La Loma - Sogamoso: dic/23
EIA en evaluación. Solicitaron Inf adicional
Cerro-Chinú-Copey: sep/22
En construcción.
Carrieles: ene/25
DAA radicado Auto de inicio, ISA radicó info adicional.
Sog-Nte-N.Esp: abr/25
Avanzan socializaciones
Avanza etapa constructiva en los tramos: T1, T3 y T6
Virginia-N.Esp: mar/24
En construcción donde se puede.
En evaluación variante Santágueda.
Radicada modificación de licencia para la llegada a Nueva Esperanza.
Ref. Suroccidental:
I. Med-Virg: oct/22. En construcción.
II. Virg-Alf: mar/25. EIA radicado.
III. Alf-SMarc: nov/22. En construcción.
Chiv-Nte-Bac: abr/25
En construcción en tramos donde es permitido.
SE Norte: Se resolvió DAA, GEB interpuso RR, ANLA resolvió.
Pacífico: may/25
Seleccionado lote.
En elaboración DAA
Quimbo-Alférez: sep/22
Avanza construcción con restricciones.
SE Colectora
SE Rioacha
SE Nueva Cuestecitas
SE Maicao
SE Cuestecitas
SE Río Córdoba
SE Termoflores
Baterias
SE TEBSA
SE El Río
SE Bonda
SE Sabanalarga
SE Guatapurí
SE El Bosque
SE Fundación
SE Bolivar
SE El Copey
SE El Paso
SE La Loma
SE La Jagua
SE Toluviejo
SE Chinú
SE Sahagún
SE Cerromatoso
SE Sogamoso
SE Heliconia
SE Ancón Sur
SE Carrieles
SE La Virginia
SE Norte
SE Chivor II
SE Bacatá
SE Nueva Esperanza
SE Pacífico
SE San Marcos
SE Alférez
SE Tesalia
Proyectos en Ejecución
Baterías
Sahagún 500 kV
Subestación Carrieles 230 kV
Subestación Pacífico 230 kV
La Loma - Sogamoso 500 kV
Atlántico 110kV
Chivor-Norte-Bacata 230kV
Colectora 500 kV
Copey-Cuestecitas-Fundación 500/220kV
T Flores-El Río-Tebsa 220kV
Guatapurí 110 kV
La Loma 110 kV
La Marina 110kV
Refuerzo Costa 500kV
Refuerzo Suroccidental 500kV
Río Cordoba - Bonda 230 kV
Sabanalarga - Bolivar 500kV
Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500kV
Tesalia 230kV
Toluviejo 220kV
Virignia - Nueva Esperanza 500kV
Ampliaciones
2 Cto Cuestecitas - La Loma 500kV
2 Cto Copey - Cuestecitas 500kV
CaribeMar
CaribeSol

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Agosto 2022

upme

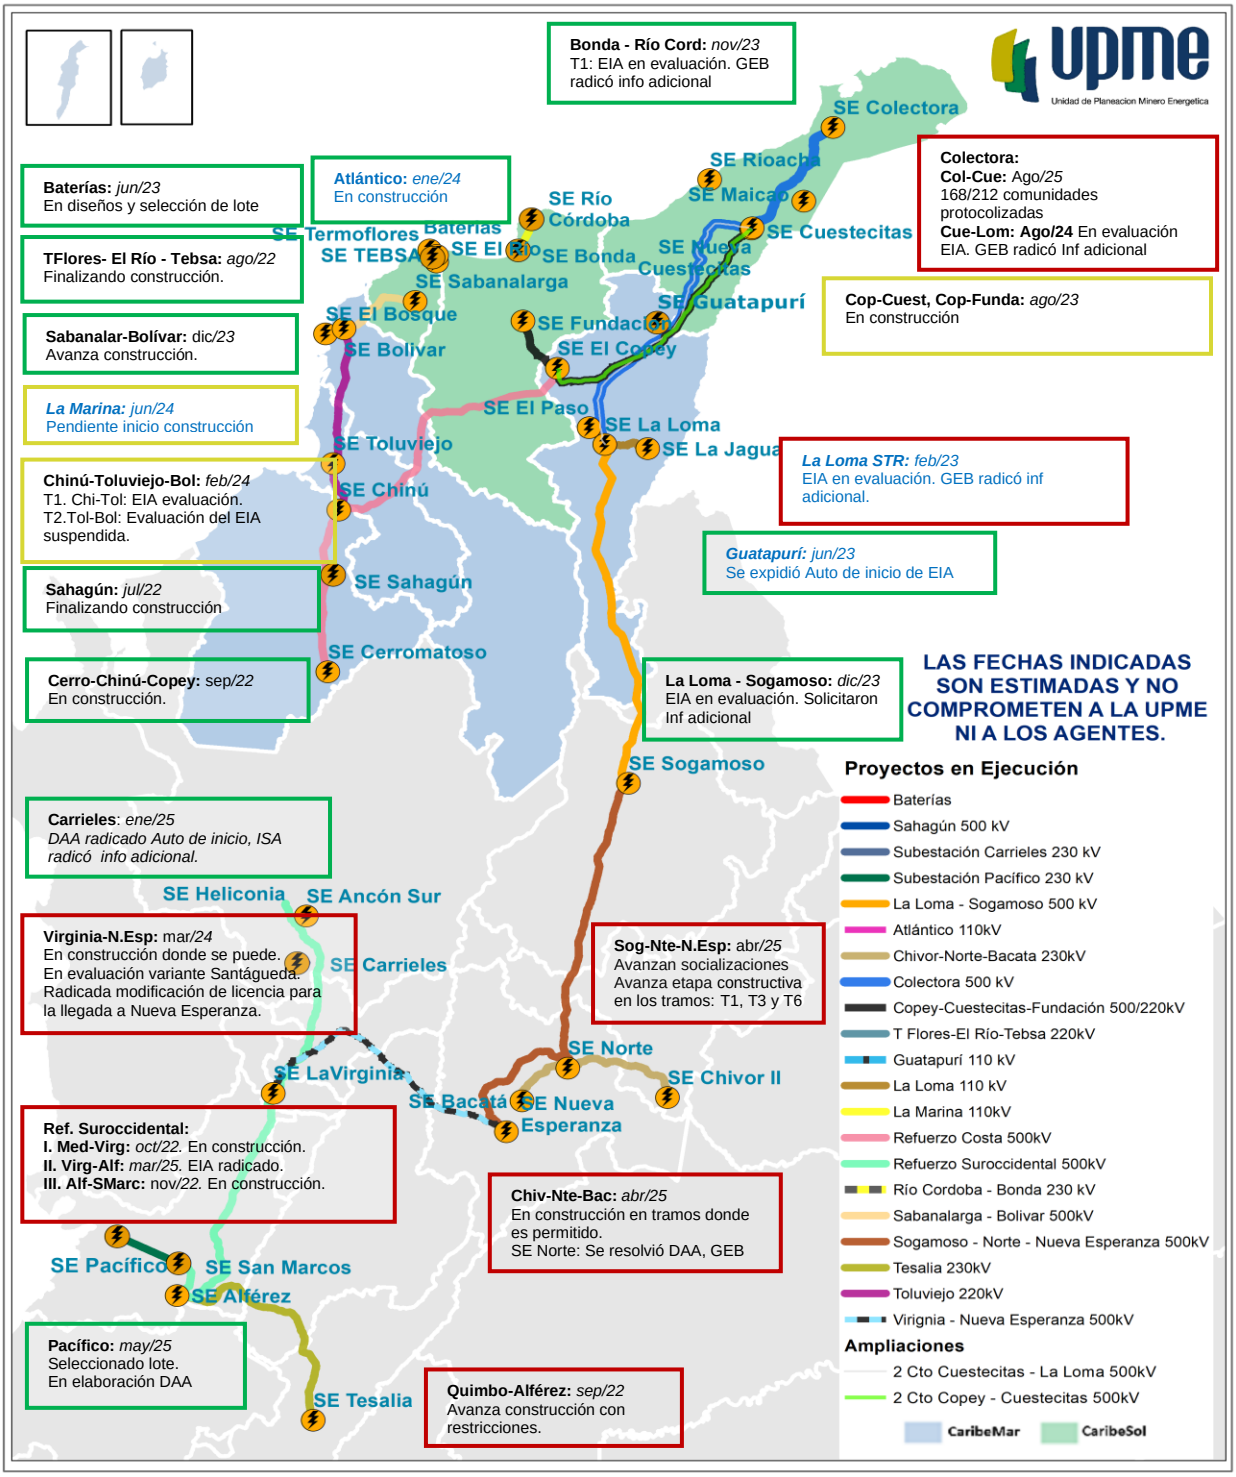

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Septiembre 2022

upme

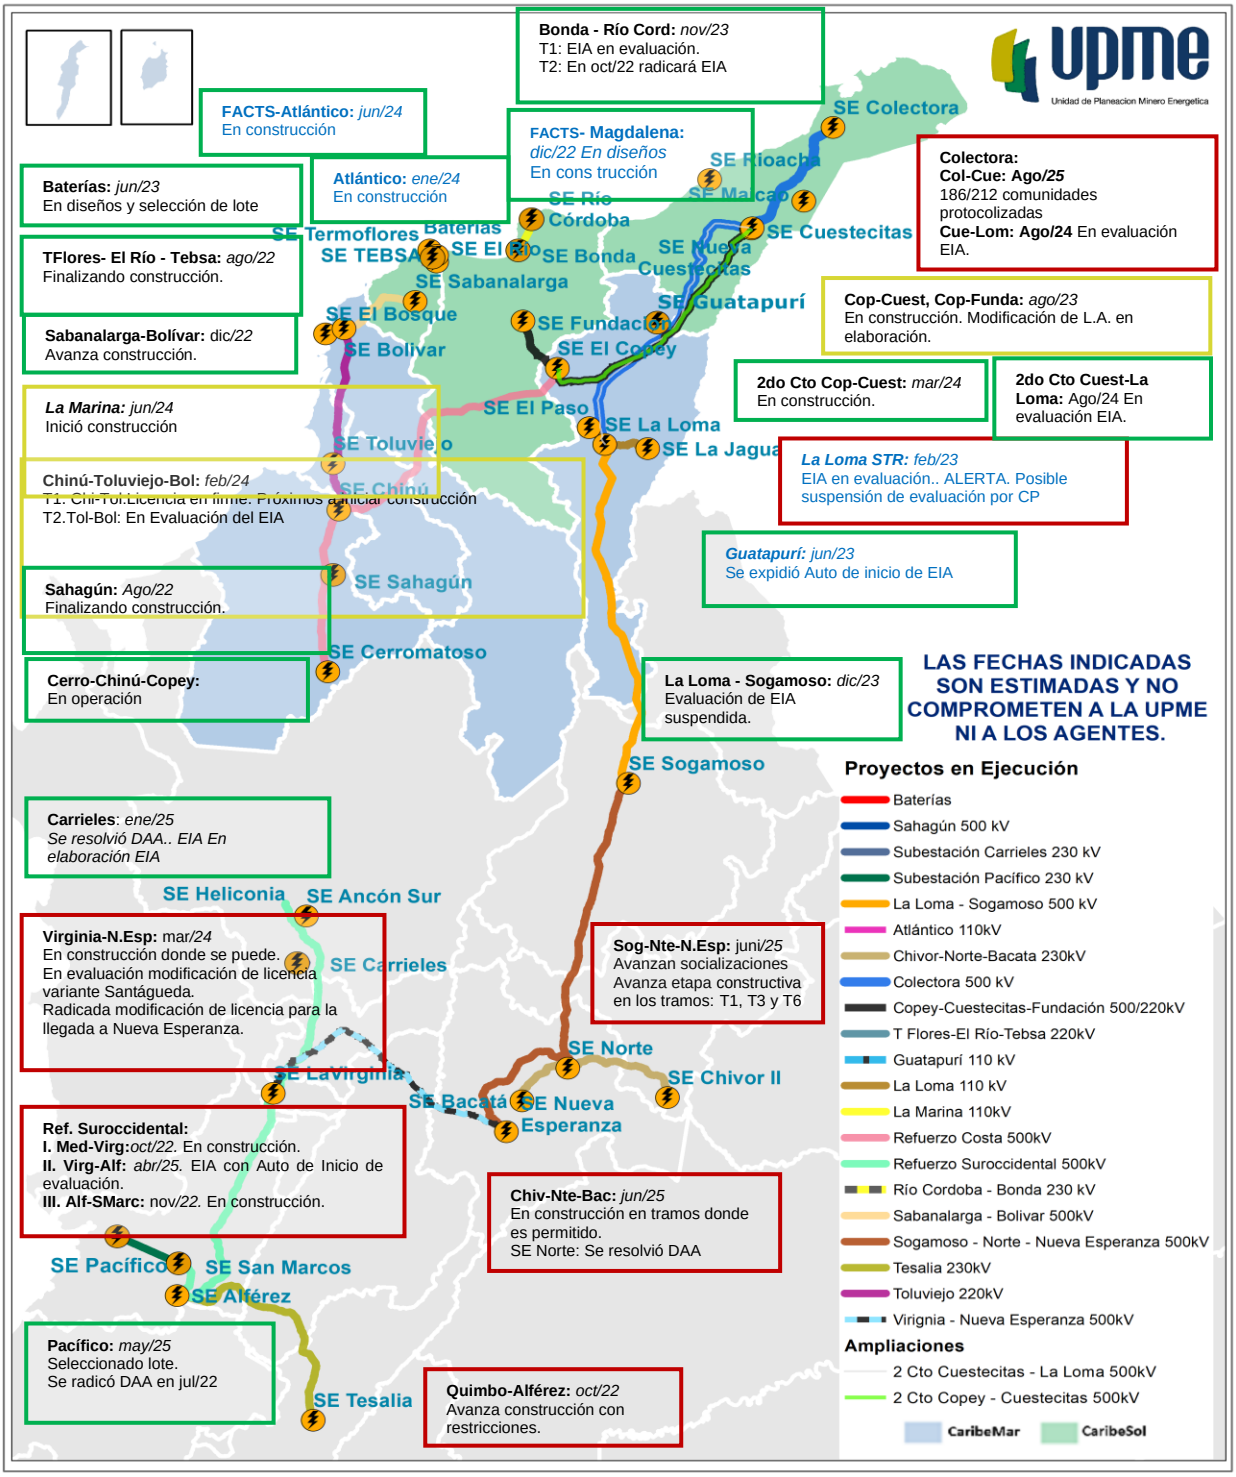

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Octubre
2022

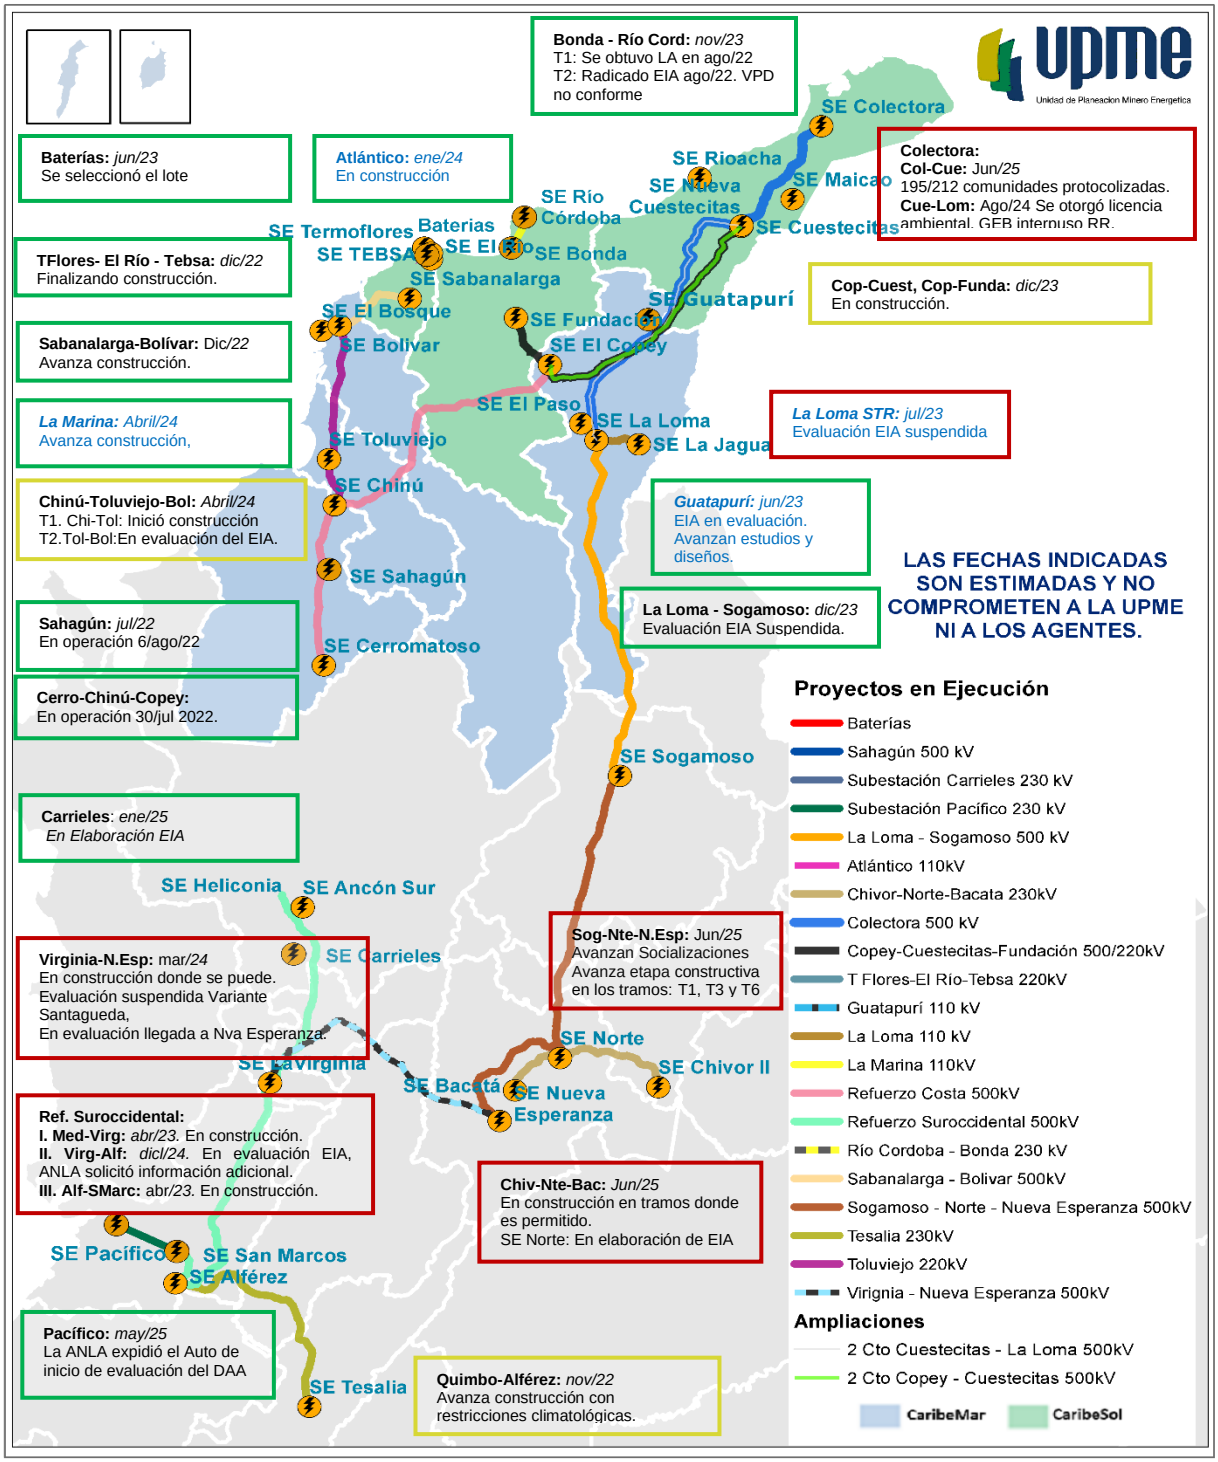

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

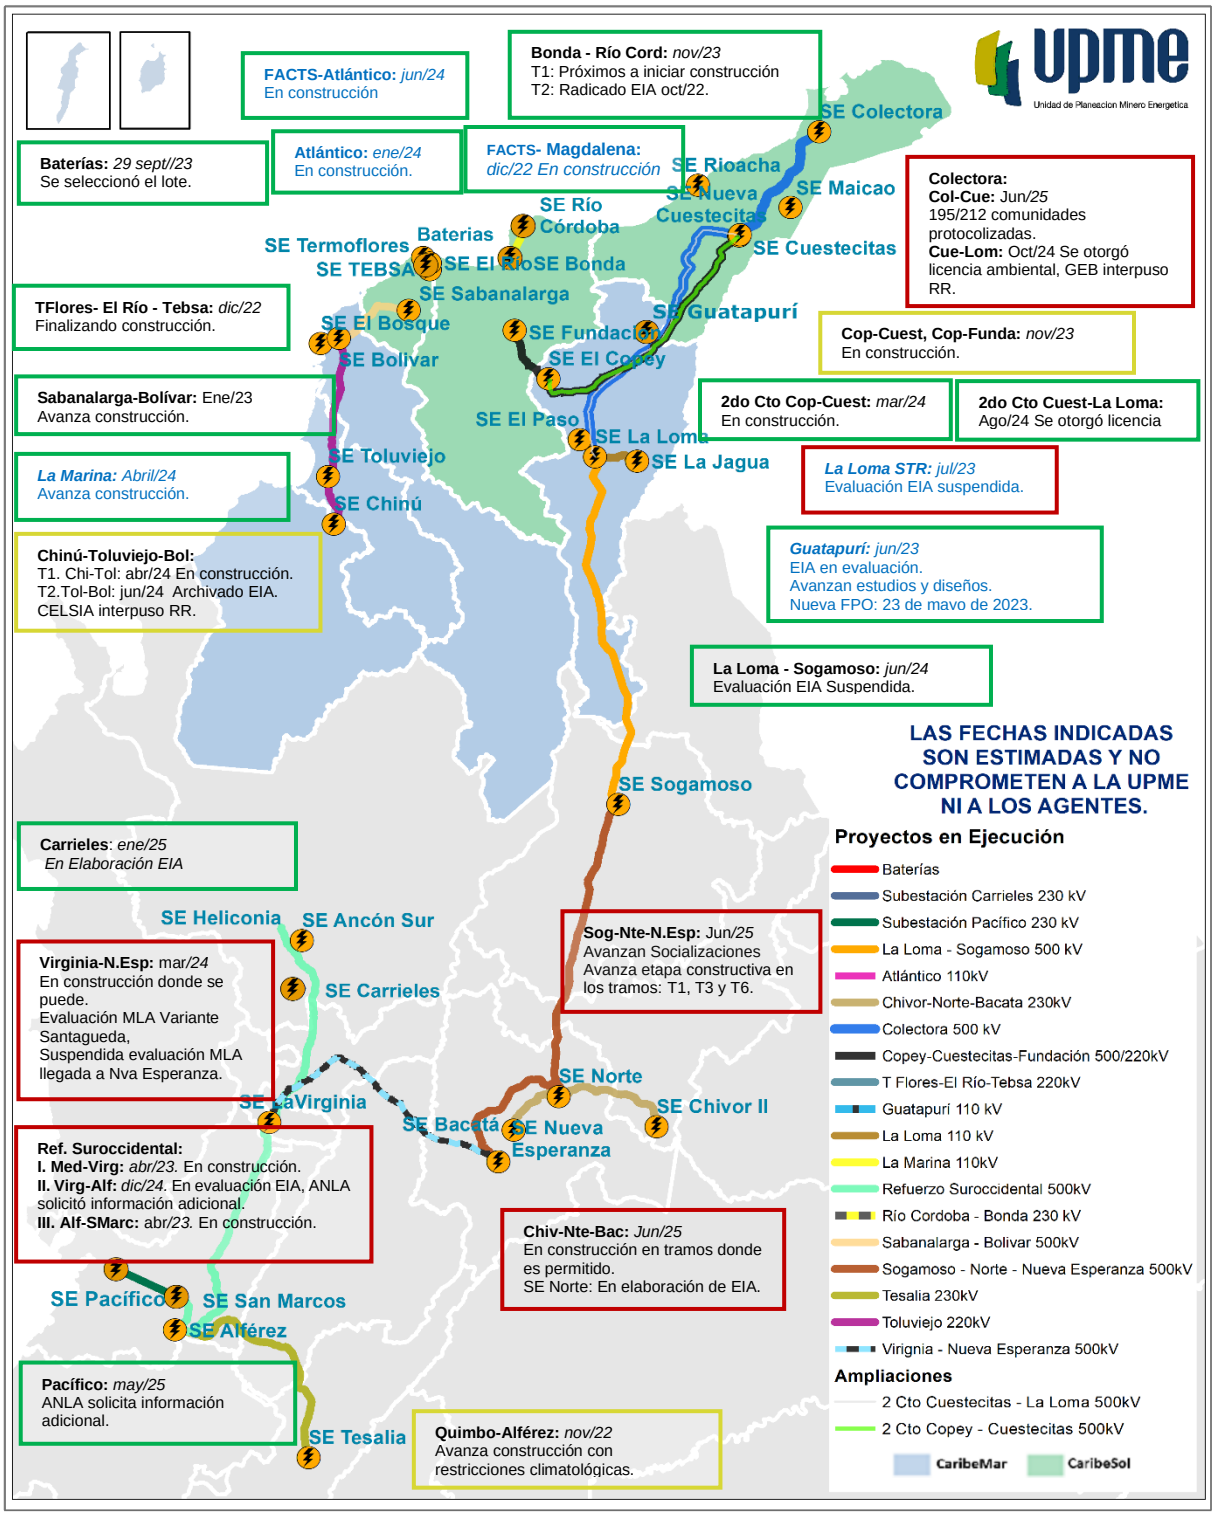
upme
Unidad de Planeación Minero Energética
FACTS-Atlántico: jun/24
En construcción
Bonda - Río Cord: nov/23
T1: Próximos a iniciar construcción
T2: Radicado EIA oct/22.
Baterías: 29 sept//23
Se seleccionó el lote.
Atlántico: ene/24
En construcción.
FACTS- Magdalena:
dic/22 En construcción
SE Colectora
SE Rioacha
SE Nueva Cuestecitas
SE Maicao
SE Cuestecitas
Colectora:
Col-Cue: Jun/25
195/212 comunidades protocolizadas.
Cue-Lom: Oct/24 Se otorgó licencia ambiental, GEB interpuso RR.
SE Río Córdoba
Baterias
SE Termoflores
SE TEBSA
SE El RíoSE Bonda
SE Sabanalarga
TFlores- El Río - Tebsa: dic/22
Finalizando construcción.
SE El Bosque
SE Bolivar
SE Fundación
SE El Copey
SE Guatapurí
Cop-Cuest, Cop-Funda: nov/23
En construcción.
Sabanalarga-Bolívar: Ene/23
Avanza construcción.
SE El Paso
SE La Loma
SE La Jagua
2do Cto Cop-Cuest: mar/24
En construcción.
2do Cto Cuest-La Loma:
Ago/24 Se otorgó licencia
SE Toluviejo
La Marina: Abril/24
Avanza construcción.
SE Chinú
La Loma STR: jul/23
Evaluación EIA suspendida.
Chinú-Toluviejo-Bol:
T1. Chi-Tol: abr/24 En construcción.
T2.Tol-Bol: jun/24 Archivado EIA.
CELSIA interpuso RR.
Guatapurí: jun/23
EIA en evaluación.
Avanzan estudios y diseños.
Nueva FPO: 23 de mavo de 2023.
La Loma - Sogamoso: jun/24
Evaluación EIA Suspendida.
LAS FECHAS INDICADAS SON ESTIMADAS Y NO COMPROMETEN A LA UPME NI A LOS AGENTES.
SE Sogamoso
Carrieles: ene/25
En Elaboración EIA
SE Heliconia
SE Ancón Sur
SE Carrieles
Virginia-N.Esp: mar/24
En construcción donde se puede.
Evaluación MLA Variante Santagueda,
Suspendida evaluación MLA llegada a Nva Esperanza.
Sog-Nte-N.Esp: Jun/25
Avanzan Socializaciones
Avanza etapa constructiva en los tramos: T1, T3 y T6.
SE Norte
SE Chivor II
SE Virginia
SE Bacatá
SE Nueva Esperanza
Ref. Suroccidental:
I. Med-Virg: abr/23. En construcción.
II. Virg-Alf: dic/24. En evaluación EIA, ANLA solicitó información adicional.
III. Alf-SMarc: abr/23. En construcción.
Chiv-Nte-Bac: Jun/25
En construcción en tramos donde es permitido.
SE Norte: En elaboración de EIA.
SE Pacífico
SE San Marcos
SE Alférez
Pacífico: may/25
ANLA solicita información adicional.
SE Tesalia
Quimbo-Alférez: nov/22
Avanza construcción con restricciones climatológicas.
Proyectos en Ejecución
Baterías
Subestación Carrieles 230 kV
Subestación Pacífico 230 kV
La Loma - Sogamoso 500 kV
Atlántico 110kV
Chivor-Norte-Bacata 230kV
Colectora 500 kV
Copey-Cuestecitas-Fundación 500/220kV
T Flores-El Río-Tebsa 220kV
Guatapurí 110 kV
La Loma 110 kV
La Marina 110kV
Refuerzo Suroccidental 500kV
Río Cordoba - Bonda 230 kV
Sabanalarga - Bolivar 500kV
Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500kV
Tesalia 230kV
Toluviejo 220kV
Virignia - Nueva Esperanza 500kV
Ampliaciones
2 Cto Cuestecitas - La Loma 500kV
2 Cto Copey - Cuestecitas 500kV
CaribeMar
CaribeSol

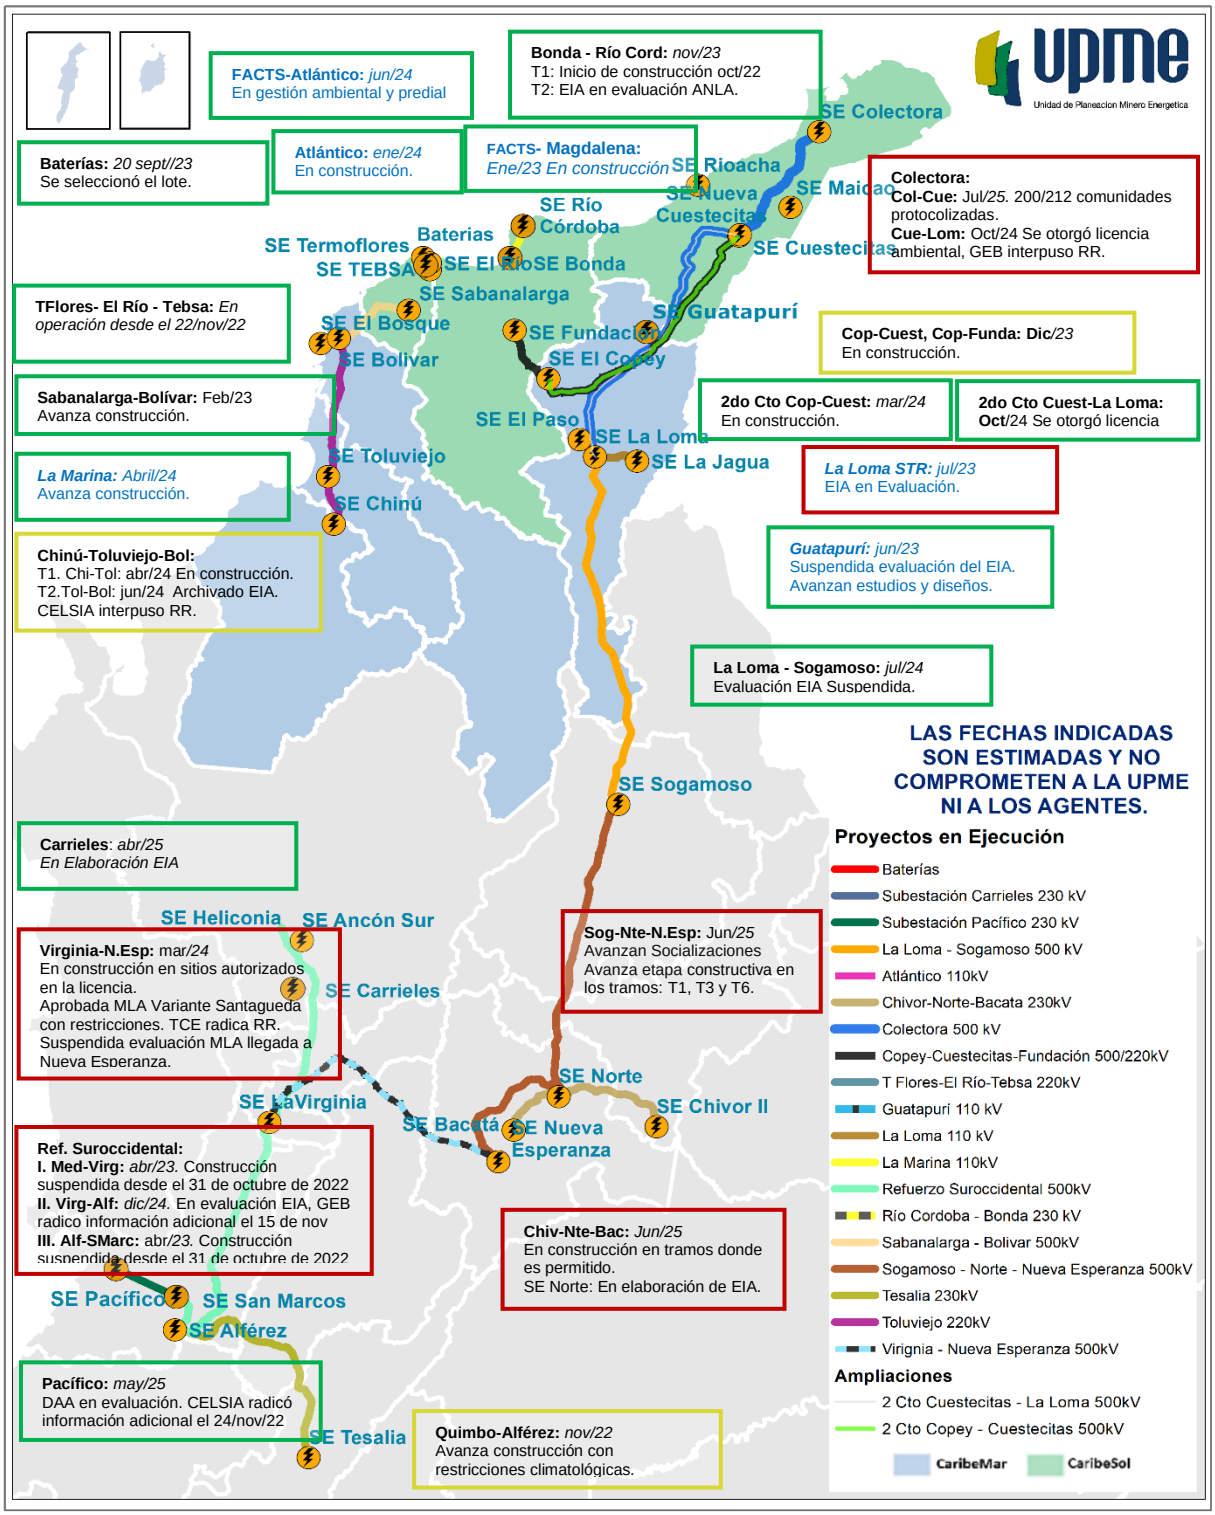
upme
Unidad de Planeación Minero Energética
FACTS-Atlántico: jun/24
En gestión ambiental y predial
Bonda - Río Cord: nov/23
T1: Inicio de construcción oct/22
T2: EIA en evaluación ANLA.
Baterías: 20 sept//23
Se seleccionó el lote.
Atlántico: ene/24
En construcción.
FACTS- Magdalena:
Ene/23 En construcción
Colectora:
Col-Cue: Jul/25. 200/212 comunidades protocolizadas.
Cue-Lom: Oct/24 Se otorgó licencia ambiental, GEB interpuso RR.
SE Colectora
SE Rioacha
SE Nueva Cuestecitas
SE Maicao
SE Cuestecitas
SE Río Córdoba
Baterias
SE Termoflores
SE TEBSA
SE El Río
SE Bonda
SE Sabanalarga
TFlores- El Río - Tebsa: En operación desde el 22/nov/22
SE El Bosque
SE Bolivar
SE Fundación
SE El Copey
SE Guatapurí
Cop-Cuest, Cop-Funda: Dic/23
En construcción.
Sabanalarga-Bolívar: Feb/23
Avanza construcción.
2do Cto Cop-Cuest: mar/24
En construcción.
2do Cto Cuest-La Loma: Oct/24 Se otorgó licencia
SE El Paso
SE La Loma
SE La Jagua
SE Toluviejo
La Marina: Abril/24
Avanza construcción.
SE Chinú
La Loma STR: jul/23
EIA en Evaluación.
Chinú-Toluviejo-Bol:
T1. Chi-Tol: abr/24 En construcción.
T2.Tol-Bol: jun/24 Archivado EIA.
CELSIA interpuso RR.
Guatapurí: jun/23
Suspendida evaluación del EIA.
Avanzan estudios y diseños.
La Loma - Sogamoso: jul/24
Evaluación EIA Suspendida.
LAS FECHAS INDICADAS SON ESTIMADAS Y NO COMPROMETEN A LA UPME NI A LOS AGENTES.
SE Sogamoso
Carrieles: abr/25
En Elaboración EIA
SE Heliconia
SE Ancón Sur
Virginia-N.Esp: mar/24
En construcción en sitios autorizados en la licencia.
Aprobada MLA Variante Santagueda con restricciones. TCE radica RR.
Suspendida evaluación MLA llegada a Nueva Esperanza.
SE Carrieles
Sog-Nte-N.Esp: Jun/25
Avanzan Socializaciones
Avanza etapa constructiva en los tramos: T1, T3 y T6.
SE Norte
SE Chivor II
SE La Virginia
SE Bacatá
SE Nueva Esperanza
Ref. Suroccidental:
I. Med-Virg: abr/23. Construcción suspendida desde el 31 de octubre de 2022
II. Virg-Alf: dic/24. En evaluación EIA, GEB radico información adicional el 15 de nov
III. Alf-SMarc: abr/23. Construcción suspendida desde el 31 de octubre de 2022
Chiv-Nte-Bac: Jun/25
En construcción en tramos donde es permitido.
SE Norte: En elaboración de EIA.
SE Pacífico
SE San Marcos
SE Alférez
Pacífico: may/25
DAA en evaluación. CELSIA radicó información adicional el 24/nov/22
SE Tesalia
Quimbo-Alférez: nov/22
Avanza construcción con restricciones climatológicas.
Proyectos en Ejecución
Baterías
Subestación Carrieles 230 kV
Subestación Pacífico 230 kV
La Loma - Sogamoso 500 kV
Atlántico 110kV
Chivor-Norte-Bacata 230kV
Colectora 500 kV
Copey-Cuestecitas-Fundación 500/220kV
T Flores-El Río-Tebsa 220kV
Guatapurí 110 kV
La Loma 110 kV
La Marina 110kV
Refuerzo Suroccidental 500kV
Río Cordoba - Bonda 230 kV
Sabanalarga - Bolivar 500kV
Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500kV
Tesalia 230kV
Toluviejo 220kV
Virignia - Nueva Esperanza 500kV
Ampliaciones
2 Cto Cuestecitas - La Loma 500kV
2 Cto Copey - Cuestecitas 500kV
CaribeMar
CaribeSol
